





GEMEINDE ISPRINGEN

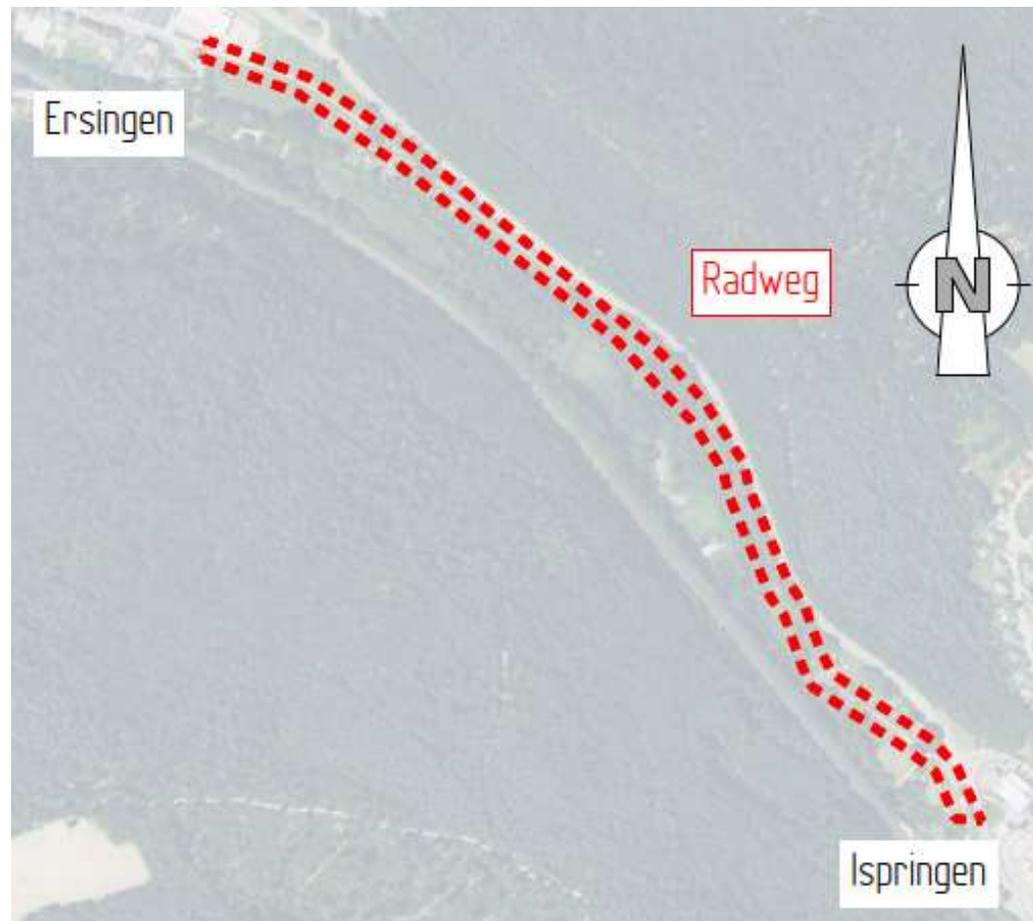

14.03.2024

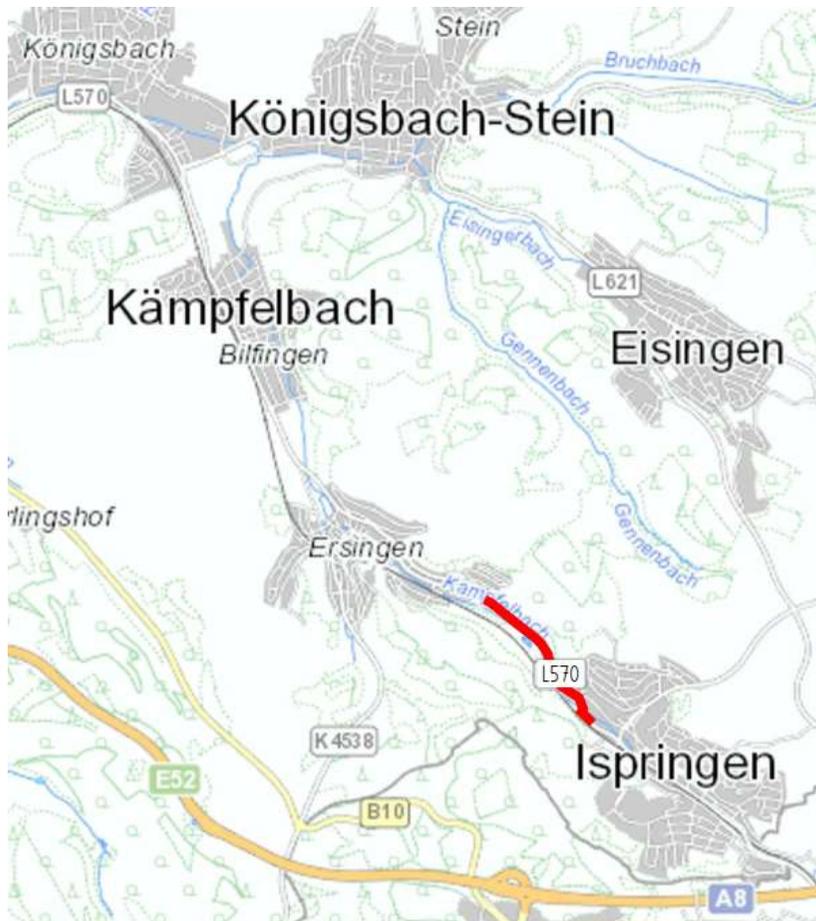

GEMEINDE ISPRINGEN

Sanierung Radweg Ispringen - Eisingen

14.03.2024

- Planungsgrundsätze
- Bestandsituation
- Vorstellung
- Durchführung der Baumaßnahme
 - Umleitungsstrecke
 - Bauabschnitte

- Sanierung Radweg zwischen Ispringen und Ersingen
- Verbesserung Verkehrssicherheit
- Verbesserung Qualität des Radweges




Unterführung Geh- und Radweg, Blickrichtung Nord-Ost



Geh- und Radweg am Böschungsfuß der L570, Blickrichtung Ersingen


Straßenbau, Teil 2

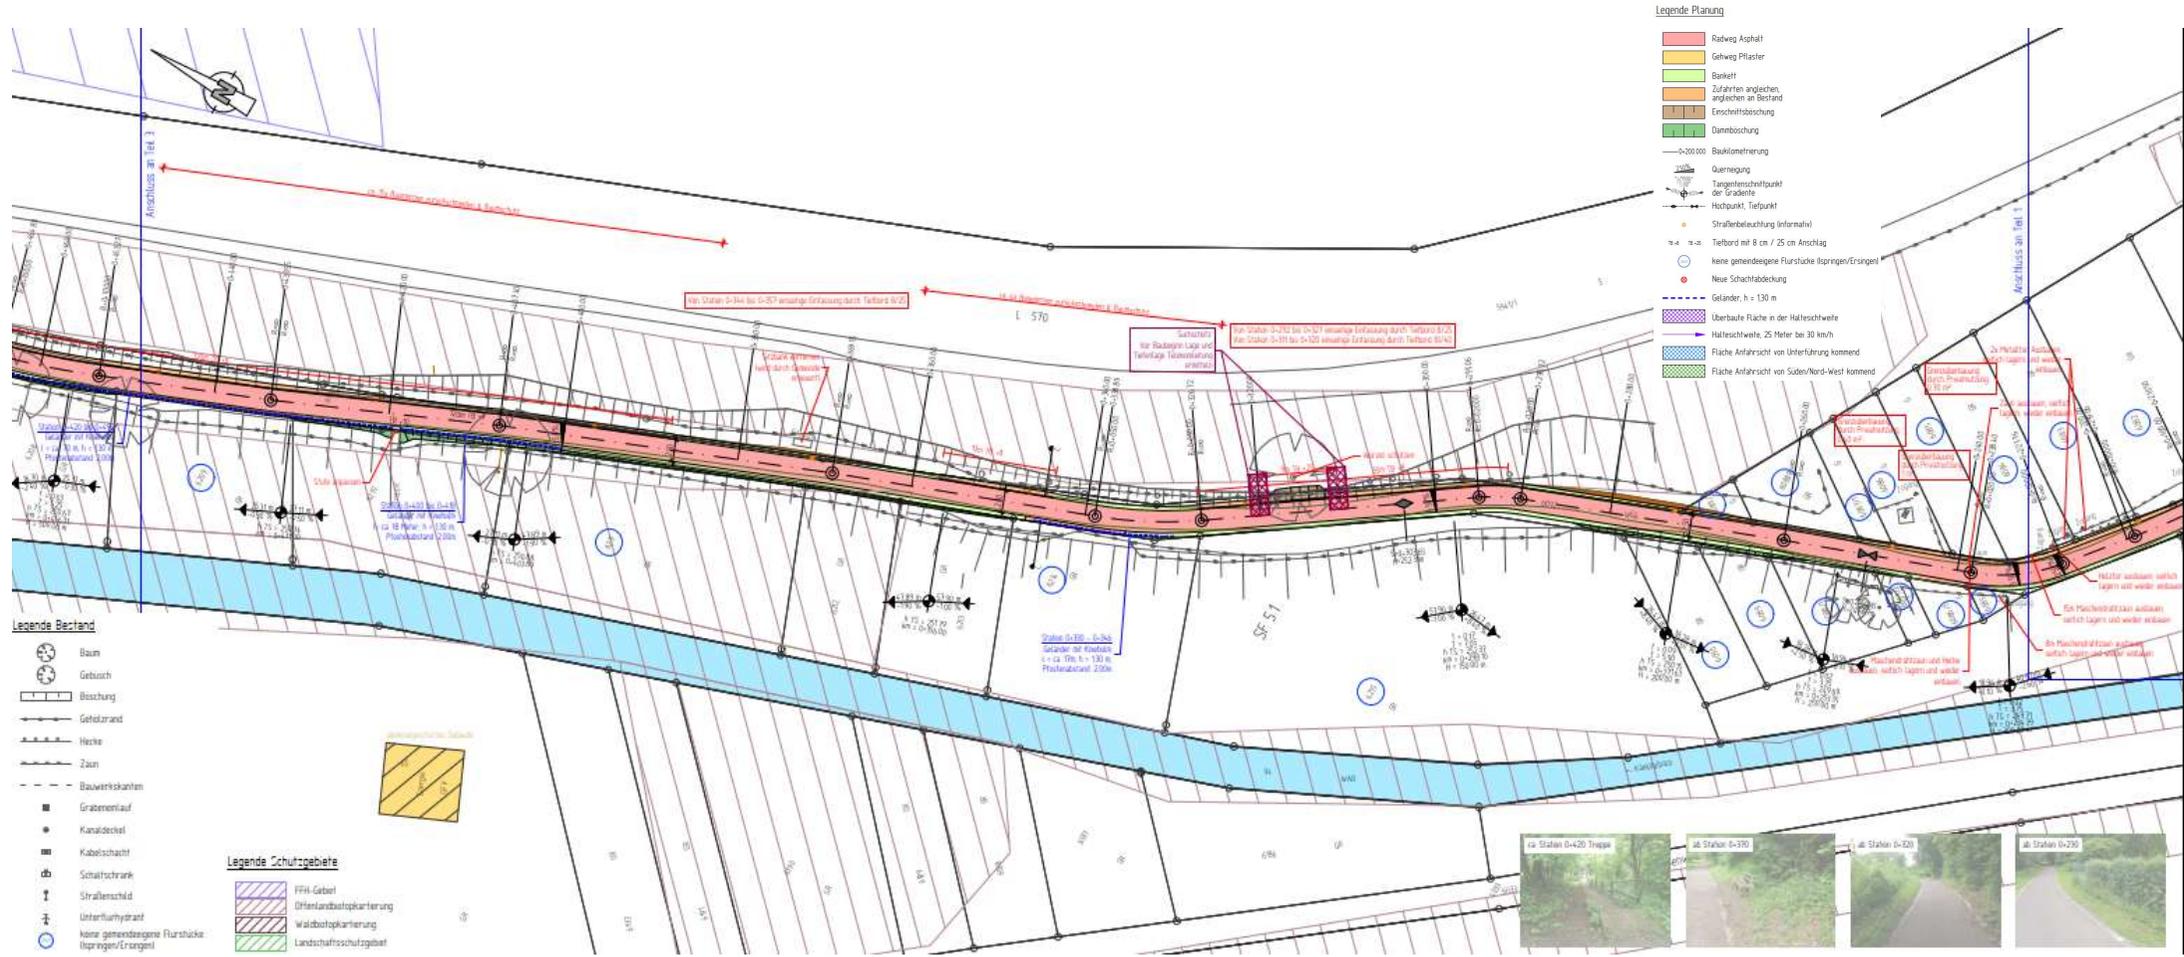


Straßenbau, Teil 3



Straßenbau, Teil 5

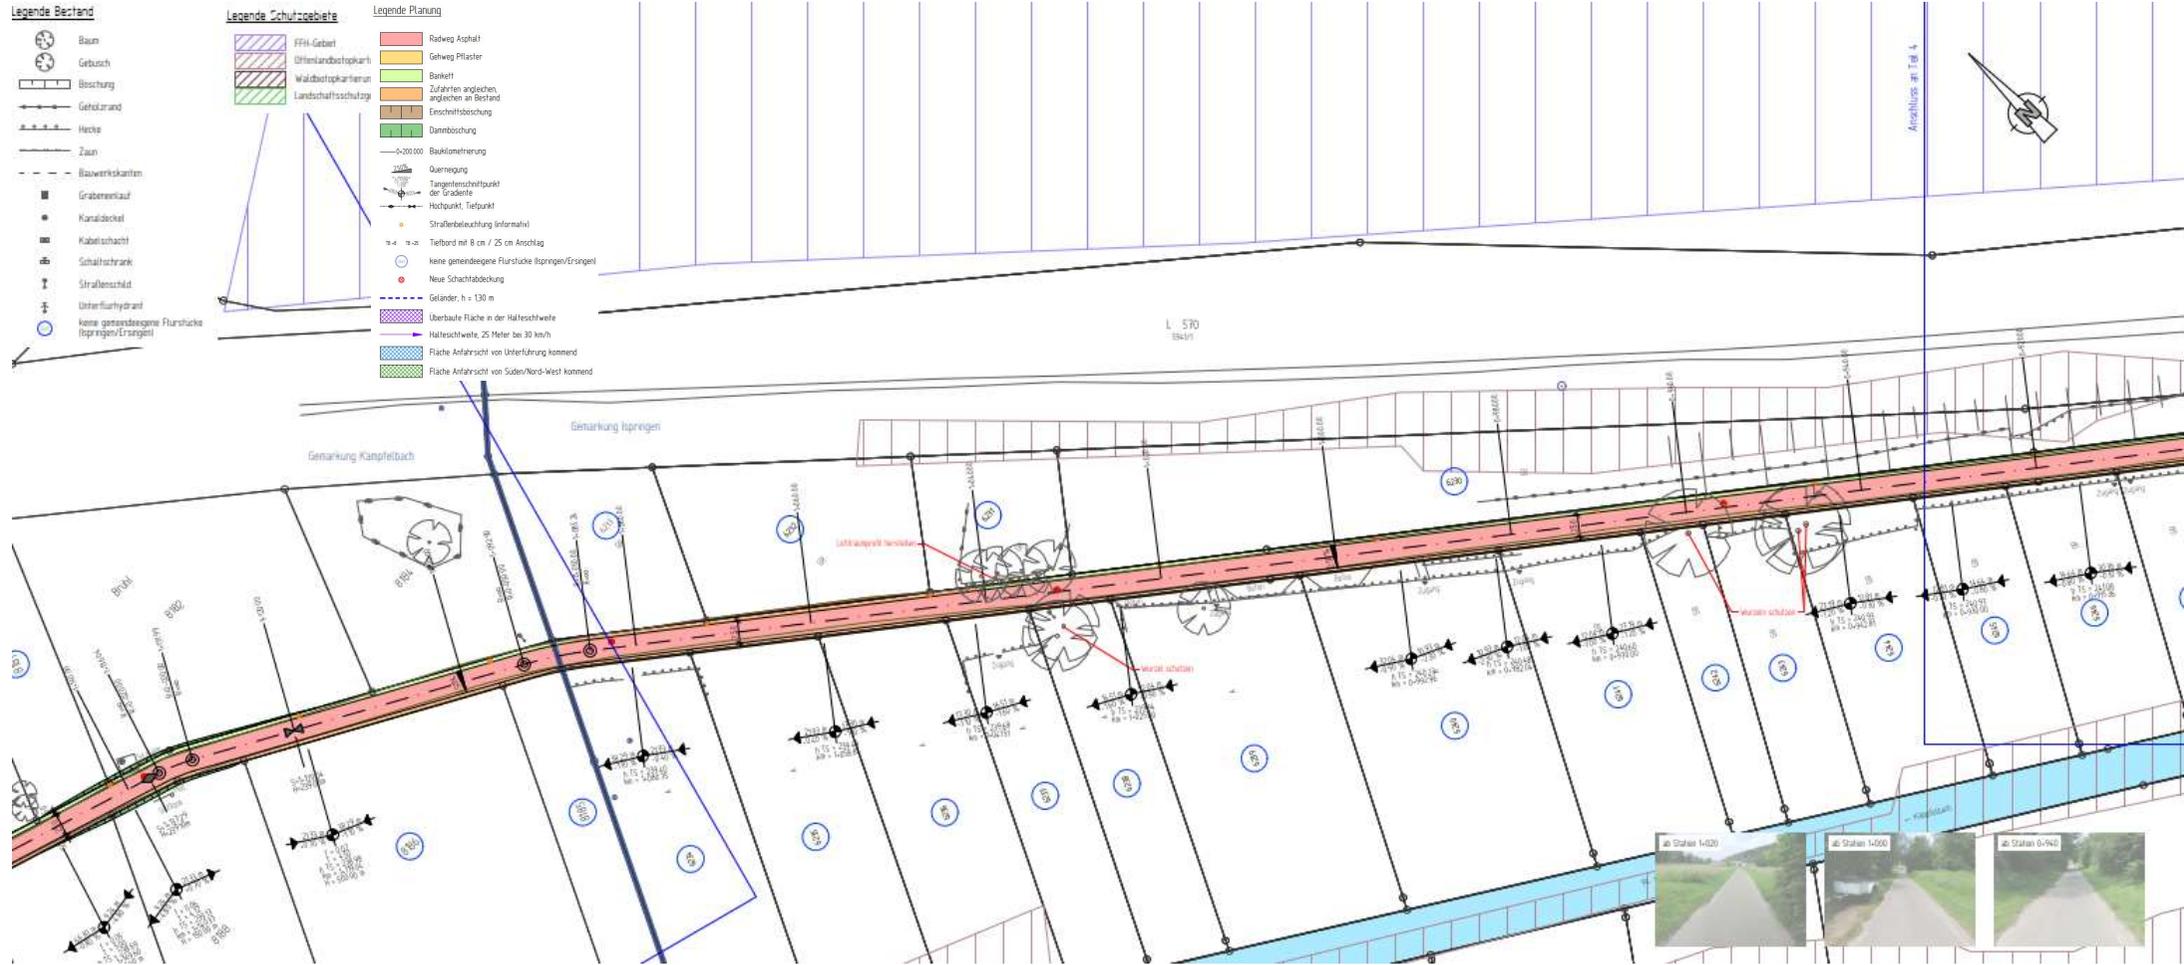

Straßenbau, Teil 6

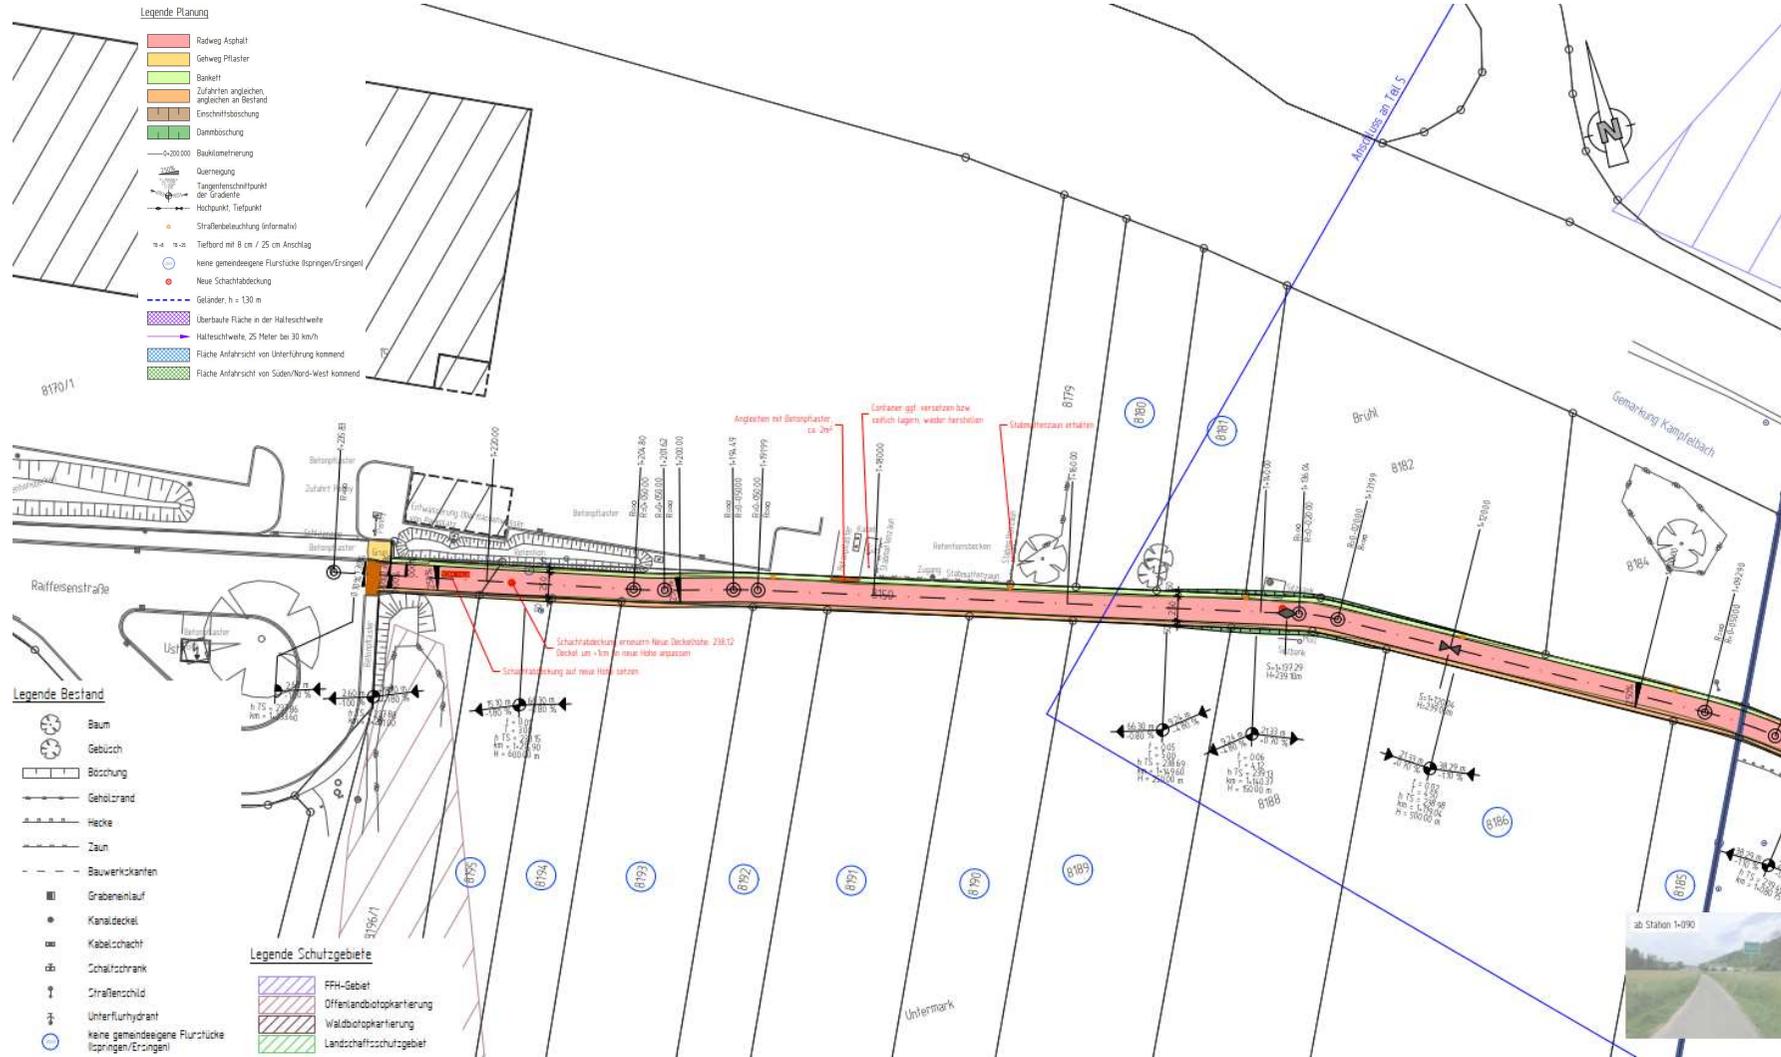


Straßenbau - Regelquerschnitt




Schnitt A-A

von Station 0+019 bis 0+040
hier ca. Station 0+020

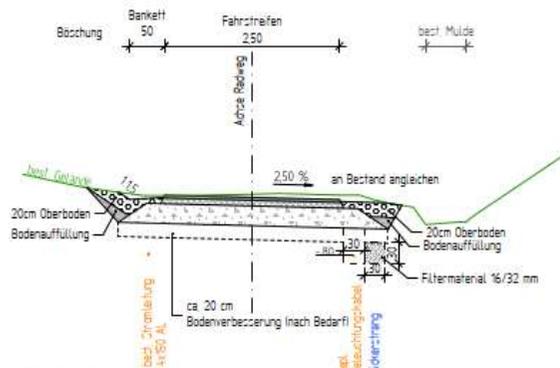


Schnitt C-C

von Station 0+292 bis 0+310, 0+321 bis 0+327, 0+344 bis 0+357, 0+388 bis 0+508, 0+697 bis 0+708, 0+728 bis 0+772
hier ca. Station 0+350

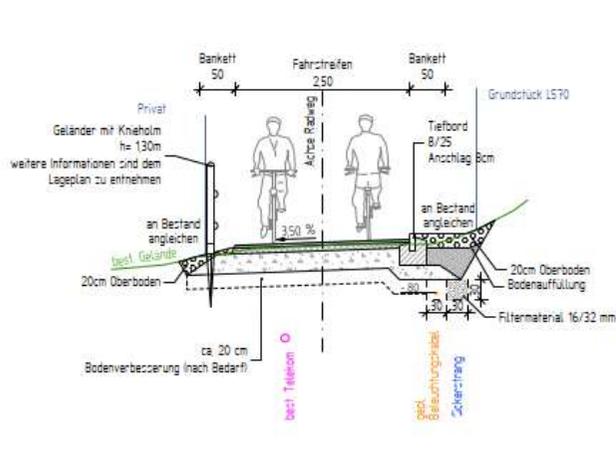


Schnitt B-B

von Station 0+045 bis 0+291, 0+328 bis 0+343, 0+358 bis 0+387, 0+509 bis 0+698, 0+773 bis Ende
hier ca. Station 0+205

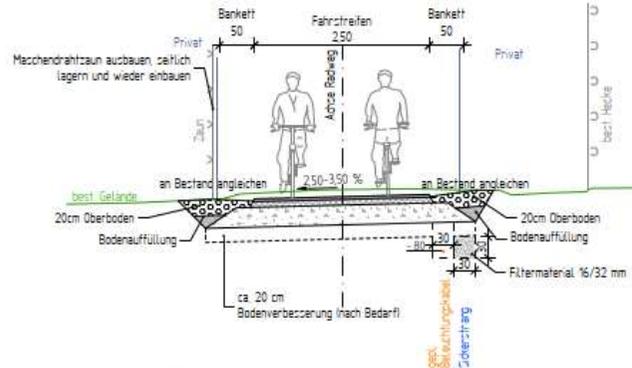


Schnitt D-D


von Station 0+311 bis 0+320, 0+709 bis 0+727
hier ca. Station 0+720

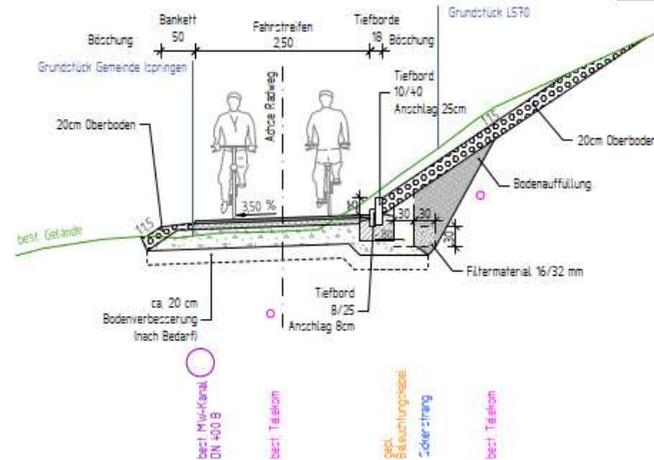

Detail Geländer Schnitt



Detail Geländer Vorderansicht



Geh- und Radwegaufbau
(in Anlehnung an RGI 12, Tafel 6, Zeile 2)


4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN	(70/100)
- C40 BR1-5 300g/m ²	(gem. TL BE-C18 15)
8 cm Asphalttragsschicht AC 32 TN	(70/100)
E _{t2} ≥ 100 MPa	
28 cm Schottertragsschicht 0/45	
E _{t1} ≥ 45 MPa	
40 cm Oberbau	
- ca. 20 cm Bodenverbesserung (nach Bedarf)	
60 cm Gesamtaufbau	

Durchführung der Baumaßnahme




- Bauzeit: 03.06.2024 bis 13.12.2024
- Vollständige Sperrung des Radwegs
- Einrichtung Umleitungsstrecke Radverkehr

Durchführung der Baumaßnahme - Umleitungsstrecke

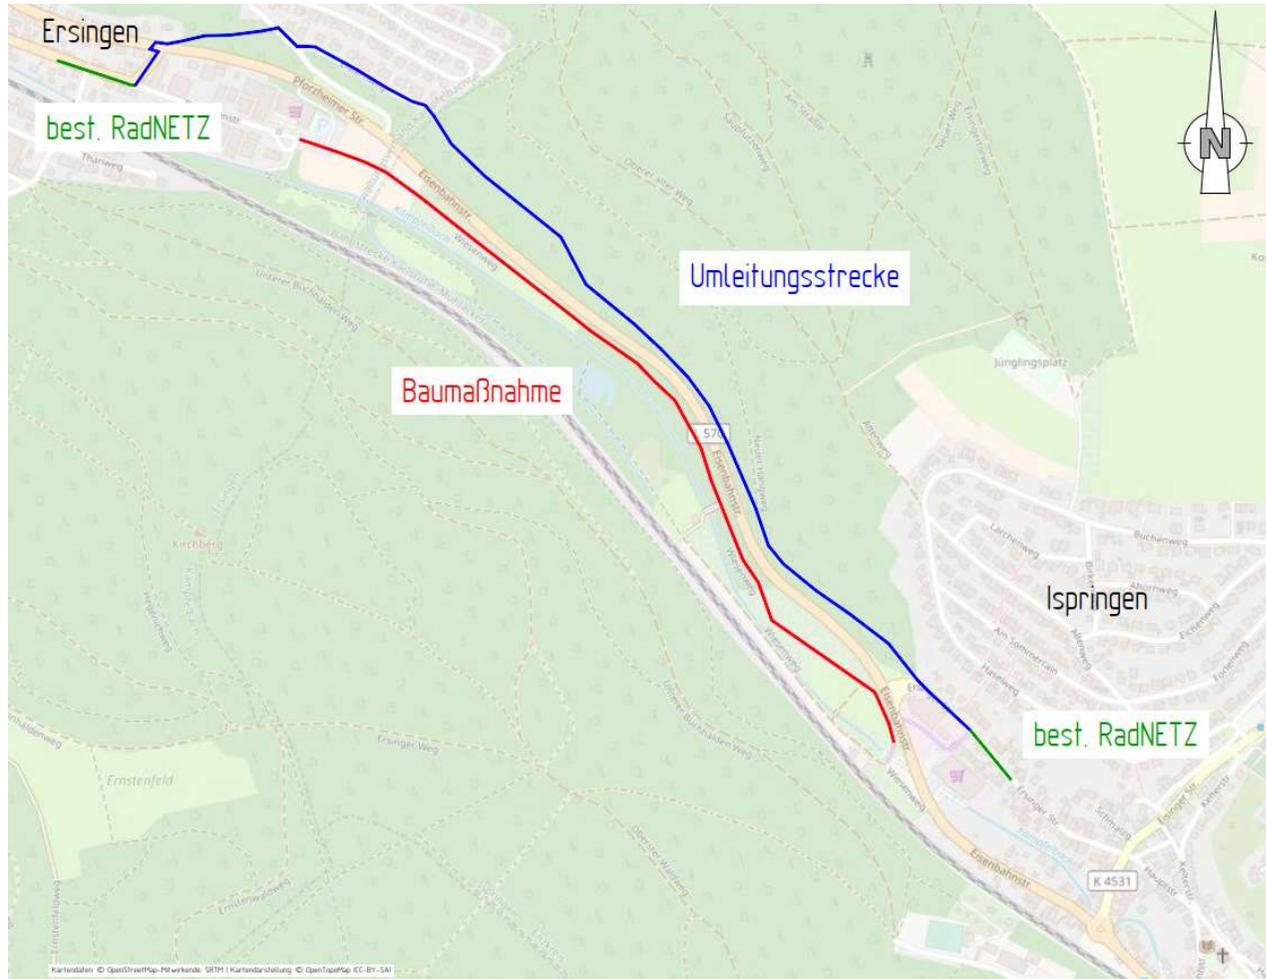

- Arbeiten in 3 Bauabschnitte zuzüglich Einbau der Asphaltdeckschicht
- Jeweils Vollsperrung des Baufelds
- Fußläufige Anbindung der Kleingärten möglich
- Weg ist bis zum Bauabschnitt eingeschränkt befahrbar, ABER:
 - Beachtung Baustellenverkehr (darf nicht behindert werden)
 - Kein Parken/Halten auf dem Weg; Fahrzeuge müssen auf Privatgrund abgestellt werden
 - Außerhalb der Arbeitszeit (z.B. Wochenende) befahren des Wegs möglich
- Das Baufeld kann nicht zu jeder Zeit befahren werden
- Keine Wende- und Ausweichmöglichkeiten entlang des Radwegtrasse

Durchführung der Baumaßnahme - Bauabschnitte

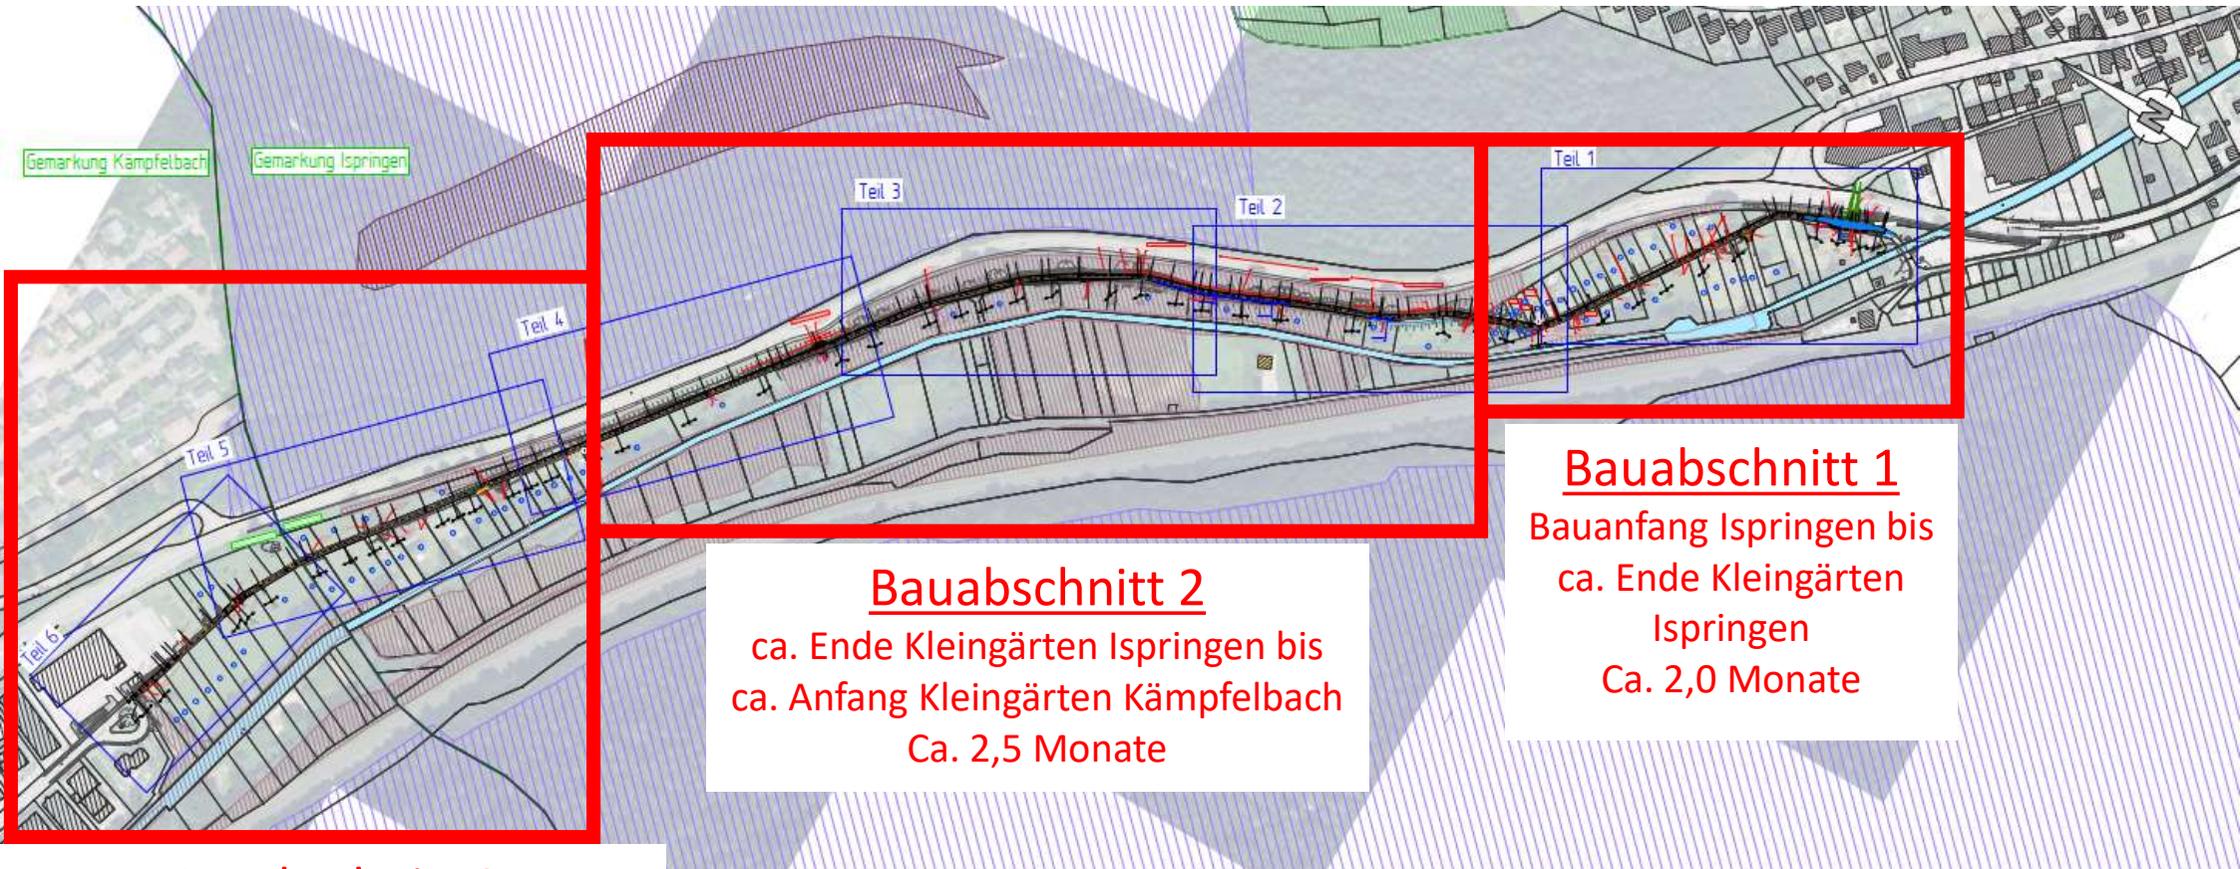

Bauabschnitt 1

Bauanfang Ispringen bis
ca. Ende Kleingärten
Ispringen
Ca. 2,0 Monate

Bauabschnitt 2

ca. Ende Kleingärten Ispringen bis
ca. Anfang Kleingärten Kämpfelbach
Ca. 2,5 Monate

Bauabschnitt 3

Ca. Anfang Kleingärten Kämpfelbach
bis ca. Bauende Kämpfelbach
Ca. 2,0 Monate



Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit!

 KIRN
INGENIEURE
BERATENDE INGENIEURE
